


Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	
						28. Jan '19	04. Feb '19	11. Feb '19	18. Feb '19	25. Feb '19	04. Mrz '19	11. Mrz '19	18. Mrz '19	25. Mrz '19	01. Apr '19	08. Apr '19	15. Apr '19	22. Apr '19	29. Apr '19	06. Mai '19	
1		Gesamt	115 Tage?	Di 13.11.18	Do 09.05.19	Gesamt															09.05
11		Verklinkerung Raum -001 und -002 hinten	20 Tage	Di 13.11.18	Di 11.12.18																
2		Fliesen unterer Bereich Wand	2 Tage	Do 22.11.18	Fr 23.11.18																
4		Reinigung ZKE keine Bauleistungen	1 Tag	Mi 23.01.19	Mi 23.01.19																
5		Spritzbeton re. PS Fa. Bauschutz und BESCHICHTUNG	30 Tage	Do 22.11.18	Di 22.01.19																
6		Trocknen Beschichtung PS rechts	7 Tage	Do 24.01.19	Fr 01.02.19																
3		Reinigung ZKE keine Bauleistungen	1 Tag	Do 20.12.18	Do 20.12.18																
8		Verfugung PS re. Zulauf Theis	4 Tage	Do 10.01.19	Di 15.01.19																
7		Messen der Stahlträger PS re	1 Tag	Di 29.01.19	Di 29.01.19																
12		Verklinkerung PS re. Theis	18 Tage	Mo 04.02.19	Do 28.02.19																
13		Gerüstbau PS rechts	1 Tag	Mi 20.02.19	Mi 20.02.19																
14		Begehung PS	1 Tag	Fr 01.03.19	Fr 01.03.19																
15		Gerüstbau Ebene PS re	2 Tage	Mi 06.03.19	Do 07.03.19																
9		Lieferung Stahlträger und Einbau	2 Tage	Fr 08.03.19	Mo 11.03.19																
10		Lieferung GAV EJ	1 Tag	Di 12.03.19	Di 12.03.19																
16		Einbau der Edelstahlabdeckungen	5 Tage	Mi 13.03.19	Di 19.03.19																
17		Leistungen ZKE Leitungen Pumpen	5 Tage	Mi 20.03.19	Di 26.03.19																
18		Tür -02 messen und bestellen	1 Tag	Do 21.03.19	Do 21.03.19																
19		Fliesen Boden -4	9 Tage	Mo 18.03.19	Do 28.03.19																
20		Malararbeiten innen	9 Tage	Mo 18.03.19	Do 28.03.19																
21		Gerüst für Lüftungsbauer	2 Tage	Fr 29.03.19	Mo 01.04.19																
22		Einbau der Lüftung Ebene 0 / -2	5 Tage	Di 02.04.19	Mo 08.04.19																
23		Türeinbau durch Schreiner Vorderseite	4 Tage	Fr 05.04.19	Mi 10.04.19																
24		Aussenanlagen	12 Tage	Do 11.04.19	Fr 26.04.19																
25		Tür Lieferung und Einbau	2 Tage	Fr 03.05.19	Mo 06.05.19																
26		Fliesenrestarbeiten	3 Tage	Di 07.05.19	Do 09.05.19																

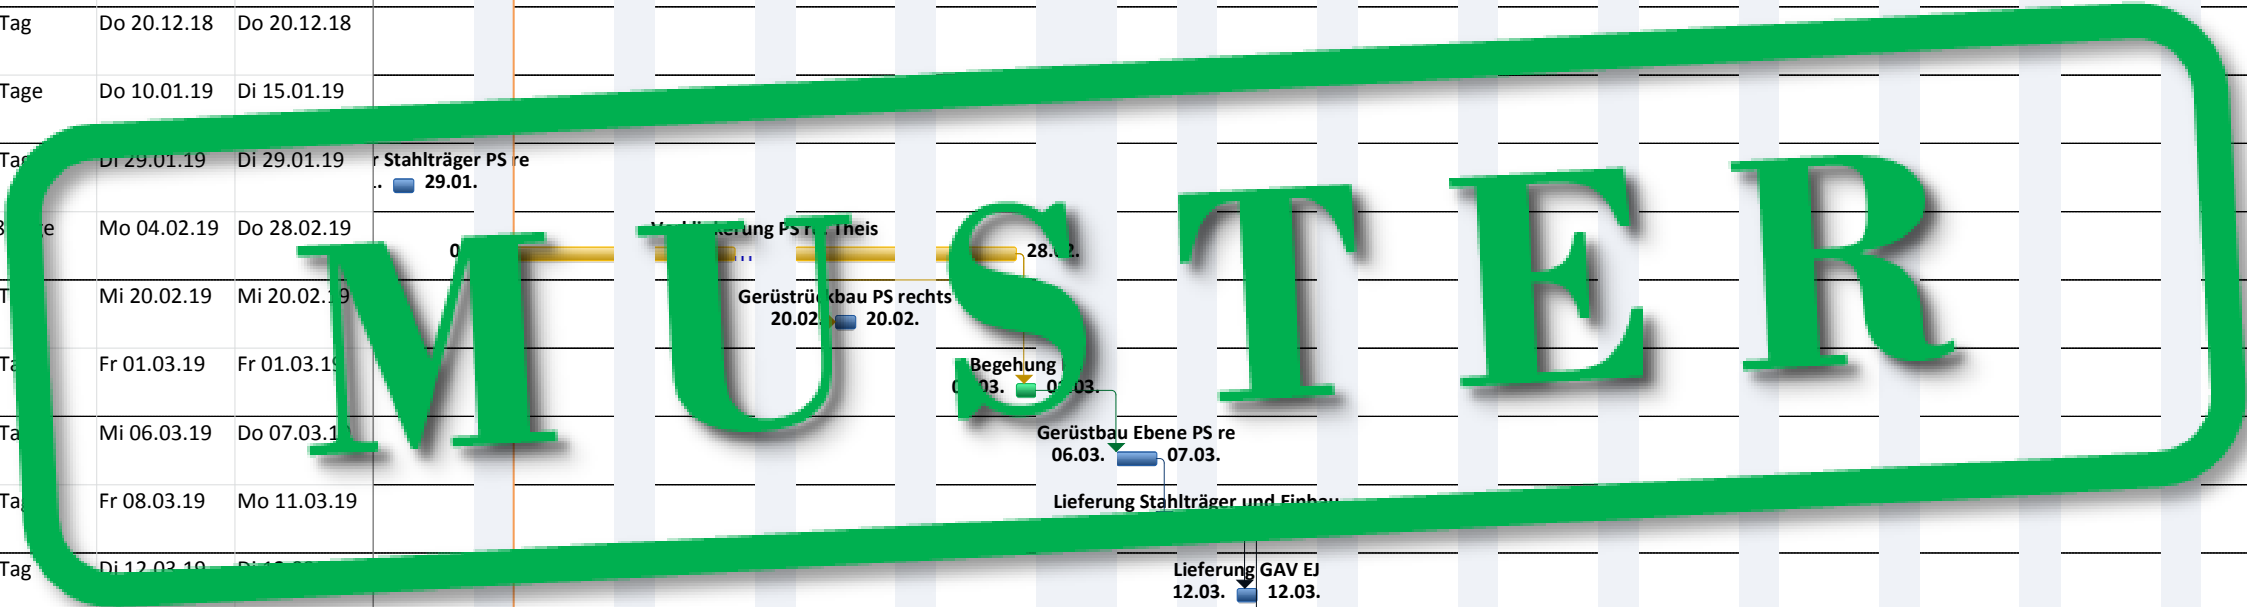

Projekt: 20190128_Bauzeitenplan
Datum: Mo 04.02.19

Vorgang		Sammelvorgang		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende	
Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
Meilenstein		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		In Arbeit	
